


1月度進捗状況及び2月度・3月度工事予定表

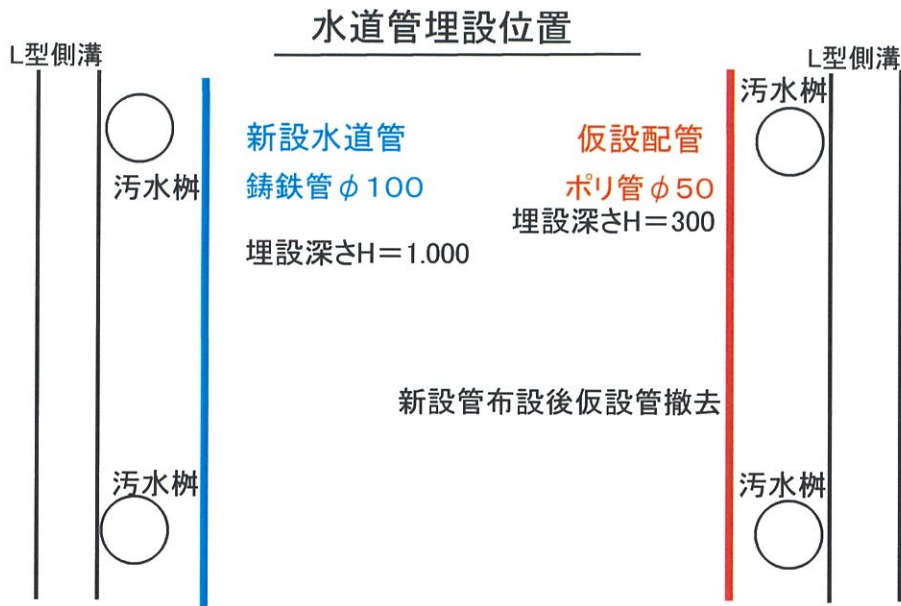

【 水道管布設工事 予定表 】

5工区 (中川町)		
⑨	本管布設工	2月 2日
⑩	通水・洗管、水圧試験	2月 2日
①	新給水管布設・給水切替工	2月 3日～2月13日
①	仮設配管撤去工	2月14日～2月17日
5工区 (中川町) 完了		2月17日
4工区 (天神町)		
①	仮設配管布設工	2月19日
②	仮設配管布設工	2月20日
③	仮設配管布設工	2月21日
④	仮設配管布設工	2月22日
①	仮設配管給水切替工	2月23日～2月29日
①	本管布設工	3月 1日
②	本管布設工	3月 2日
③	本管布設工	3月 4日
④	本管布設工	3月 5日
⑤	本管布設工	3月 6日
⑥	本管布設工	3月 7日
⑦	本管布設工	3月 8日
⑧	本管布設工	3月11日
⑨	本管布設工	3月12日
⑩	通水・洗管、水圧試験	3月13日
①	新給水管布設・給水切替工	3月13日～3月21日
①	仮設配管撤去工	3月22日～3月26日
4工区 (天神町) 完了		3月26日
3工区 (蛭子町)		
	舗装切断工	3月 9日、3月16日
①	仮設配管布設工	3月27日頃から着工

【お問合せ先】

株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

施工中は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます。)

車の移動をお願いする場合があります。

作業時間【8:45～16:45】雨天順延になります。

水道管布設工事のお知らせ・工事予定表 5工区(中川町) 4工区(天神町) 3工区(蛭子町)

予定表は別紙

