


4月度進捗状況及び5月度・6月度工事予定表

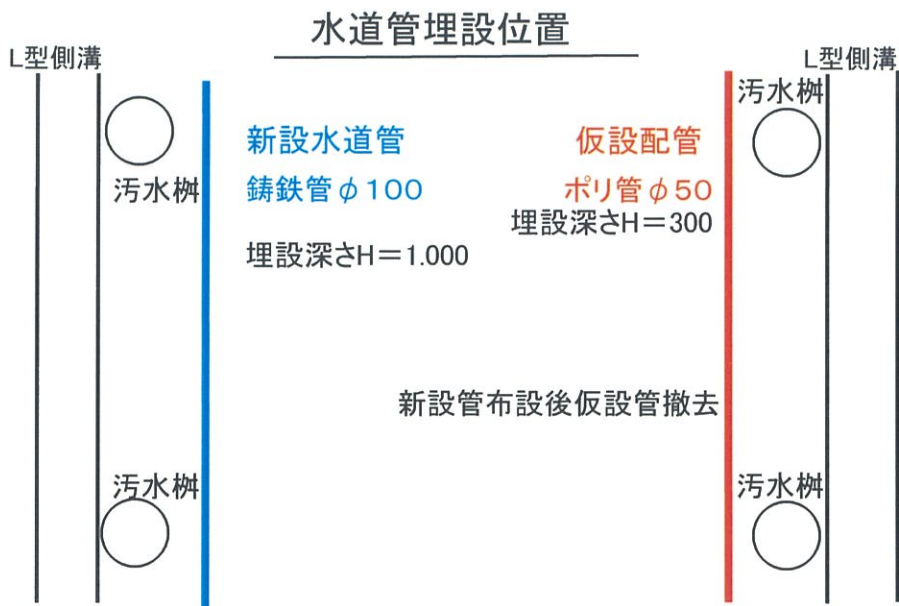

【 水道管布設工事 予定表 】

3工区 (蛭子町)	
① 新設本管布設工	完了
① 新給水管布設・給水切替工	4月22日～5月 2日
現場休み	5月 3日～5月 6日
仮設配管撤去工	5月 7日～5月10日
3工区 (蛭子町) 完了	
2工区 (新町一区)	
舗装切断工 (完了)	4月23日、4月24日
仮設配管布設工	5月13日～5月17日
仮設配管給水切替工	5月18日～5月27日
新設本管布設工	5月27日～6月 6日
通水・洗管、水压試験	6月 7日
新給水管布設・給水切替工	6月 7日～6月19日
仮設配管撤去工	6月20日～6月25日
2工区 (新町一区) 完了予定	6月25日
1工区 (新町二区)	
舗装切断工	6月11日、6月12日
新町二区 6月25日 頃から工事着工予定	

【お問合せ先】

株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

施工中は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます。)

車の移動をお願いする場合があります。

作業時間【8:45～16:45】雨天順延になり

水道管布設工事のお知らせ・工事予定表 3工区(蛭子町) 2工区(新町一区)

予定表は別紙

