


6月度進捗状況及び7月度・8月度工事予定表

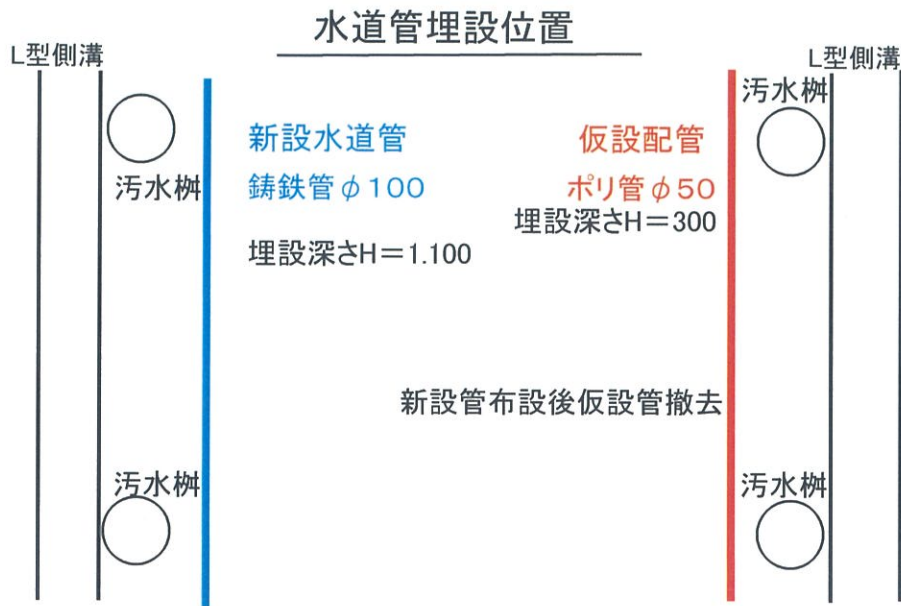

【 水道管布設工事 予定表 】

2工区 (新町一区)	完了	6月20日
1工区 (新町二区)		
	舗装切断工 (完了)	6月11日
	仮設配管布設工 (完了)	6月21日~6月26日
	仮設配管給水切替工	6月27日~7月 5日
	新設本管布設工	7月 8日~7月22日
	通水・洗管、水圧試験	7月23日
	新給水管布設・給水切替工	7月23日~7月31日
	仮設配管撤去工	8月 1日~8月 7日
1工区 (新町二区)	完了予定	8月 7日
全路線 完了		

【お問合せ先】

株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

施工中は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます。)

車の移動をお願いする場合があります。

作業時間【8:45~16:45】雨天順延になります。

水道管布設工事のお知らせ・工事予定表

1工区(新町二区)

予定表は別紙

