


2月度進捗状況及び3月度・4月度工事予定表

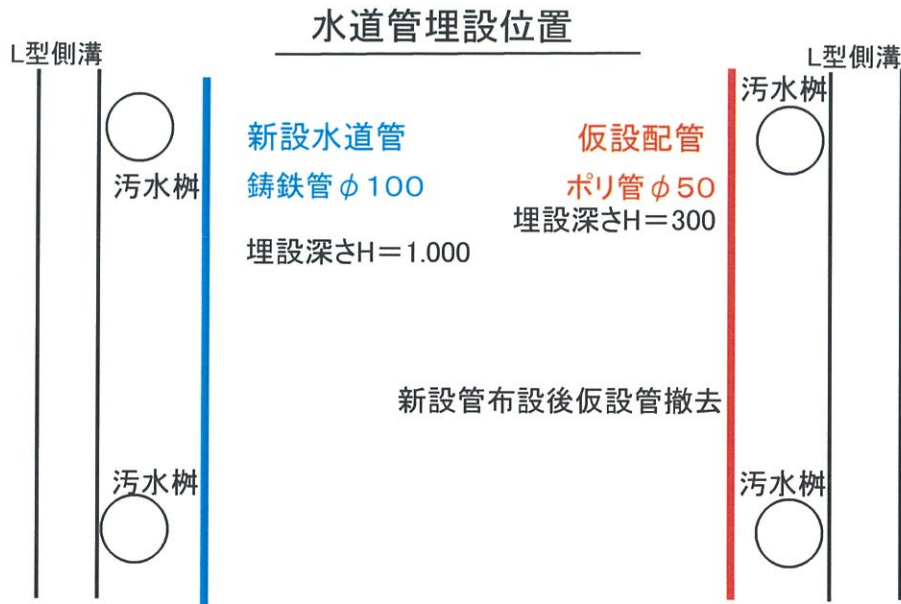

【 水道管布設工事 予定表 】		
5工区 (中川町)	完了	
4工区 (天神町)		
	仮設配管布設工	完了
	仮設配管給水切替工	完了
①	本管布設工	2月26日
②	本管布設工	2月27日
③	本管布設工	2月28日
④	本管布設工	2月29日
⑤	本管布設工	3月 1日
⑥	本管布設工	3月 2日
⑦	本管布設工	3月 4日
⑧	本管布設工	3月 5日
⑨	本管布設工	3月 6日
⑩	通水・洗管、水圧試験	3月 7日
①	新給水管布設・給水切替工	3月 7日～3月16日
①	仮設配管撤去工	3月18日～3月21日
4工区 (天神町)	完了	3月21日
3工区 (蛭子町)		
	舗装切断工	3月 7日、3月 8日
①	仮設配管布設工	3月22日
②	仮設配管布設工	3月23日
③	仮設配管布設工	3月25日
④	仮設配管布設工	3月26日
⑤	仮設配管布設工	3月27日
①	仮設配管給水切替工	3月28日～4月 4日
①	本管布設工	4月 5日～4月18日
①	新給水管布設・給水切替工	4月19日～4月27日
①	仮設配管撤去工	4月29日～5月 2日

【お問合せ先】

株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

施工中は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます。)

車の移動をお願いする場合があります。

作業時間【8:45～16:45】雨天順延になります。

水道管布設工事のお知らせ・工事予定表 4工区(天神町) 3工区(蛭子町)

予定表は別紙

